

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 01.10.2021

«Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області»

(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту 77 370,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми 2707160 «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» ✓
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проєктом 36 927,0 тис. грн. ✓
8. Інформація щодо проєктної організації: ФОП Ариповський С.М. (5 об'єктів)
9. Інформація щодо підрядної організації: ТОВ «БВК ПМК-226» (2 об'єкти)
10. Виконання плану реалізації та фінансування проєкту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|---|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи | | | | | | |

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|--|---|----------------------|--|----------------------|--|--|
| | строки | вартість (тис. грн.) | строки виконання (номер договору, дата укладення) | вартість (тис. грн.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проєктних робіт: | Квітень - травень | 1 350,0 | Червень - вересень | 1 120,0 | Затримка з погодженням паспорту бюджетної програми КПКВК 2707160 (наказ Міндовкілля від 24.05.2021 №336) | |
| Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проєкту | Квітень - травень | 180,0 | Договір № 522 від 16.07.2021 ФОП «Ариповський С.М.» | 170,0 | | |
| Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проєкту | Квітень - травень | 210,0 | Договір № 422 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.» | 210,0 | | |
| Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від смт. Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проєкту | Квітень - травень | 460,0 | Договір № 521 від 16.07.2021 ФОП «Ариповський С.М.» | 440,0 | | |
| Розробка ПКД на «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проєкту | Квітень - травень | 500,0 | Договір № 423 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.» | 300,0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|-----------------|--|-----------------|---|--|
| 2. Проведення процедури закупівлі щодо: | Червень – серпень | | Серпень - жовтень | | | |
| 2.1. Будівельних робіт | | 37 397,5 | | 16 935,2 | | |
| Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області | | 4290,7 | Договори від 06.12.2019 №1200 з ТОВ «БВК ПМК-226» та від 05.07.2021 № 465 з ФОП Мовенко С.М. | 4290,7 | | |
| Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області | Червень – липень | 3 700,00 | | | Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕСБ) | Процедура закупівлі оголошена 23.09.2021 |
| Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області | Липень – серпень | 4 670,00 | Договір №710 від 01.10.2021 ТОВ «БВК ПМК-226» | 1 363,5 | Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДЕСБ | Вартість робіт уточнена в результаті проектування |
| Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області | Липень-серпень | 12 065,00 | | | Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДЕСБ | Процедура закупівлі оголошена 30.09.2021 |
| Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області | Липень-серпень | 12 700,00 | | 11 281,0 | | Процедура закупівлі оголошена 26.08.2021, визначено переможця, договір буде укладено після 04.10.2021. Економія виникла у результаті процедури закупівлі |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-----------------|--|-----------------|---|---|
| 2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт): | | 1 067,4 | | 173,2 | | |
| 2.3.1. утримання служби замовника | | 533,7 | | 84,5 | | |
| 2.3.2. авторський нагляд | | 177,9 | Договір з ФОП Ариповський С.М. №708 від 01.10.2021 Договір з ФОП Ариповський С.М. №709 від 01.10.2021 | 17,0 4,3 | | |
| 2.3.3. технічний нагляд | | 355,8 | Договір з ФОП Мовенко С.М. № 465 від 05.07.2021, №466 від 29.09.2021 | 49,4 18,0 | | |
| 3. Разом (1 + 2) | | 38 747,5 | | 18 055,2 | | |

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------|--|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі: | Квітень - травень | 1 350,0 | Серпень - вересень | 1 075,2 | | |
| Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту | Квітень - травень | 180,0 | Договір № 522 від 16.07.2021 ФОП «Ариповський С.М.» | 170,0 | Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДЕСБ | Роботи завершено, отримано позитивний звіт експертизи 14.09.2021 |
| Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт.Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту | Квітень - травень | 210,0 | Договір № 422 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.» | 165,2 | Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДЕСБ | Роботи завершено, отримано позитивний звіт експертизи 31.08.2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|-----------------|---|----------------|---|---|
| Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту | Квітень - травень | 460,0 | Договір № 521 від 16.07.2021 ФОП «Ариповський С.М.» | 440,0 | Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДЕСБ | Роботи завершено, отримано позитивний звіт експертизи 24.09.2021 |
| Розробка ПКД на «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту | Квітень - травень | 500,0 | Договір № 423 від 24.06.2021 ФОП «Ариповський С.М.» | 300,0 | Затримка з отриманням експертного звіту, спричинена реєстраційними діями ЄДЕСБ | Роботи завершено, отримано позитивний звіт експертизи 13.08.2021 |
| 2. Виконання, усього, у т. ч. | Квітень - грудень | 35 577,0 | Серпень-грудень | 2 628,4 | | |
| 2.1. будівельних робіт: | | | | | | |
| Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області | Квітень – грудень | 3 260,0 | Договори від 06.12.2019 №1200 з ТОВ «БВК ПМК-226» та від 05.07.2021 № 465 з ФОП Мовенко С.М. (технічний нагляд) | 2 628,4 | | |
| Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області | Травень - грудень | 3 700,0 | | | Процедура закупівлі оголошена 23.09.2021. Роботи будуть розпочаті після отримання дозволу на проведення будівельних робіт | |
| Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт.Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області | Червень - грудень | 4 670,0 | Договори від 01.10.2021 № 710 ТОВ «БВК ПМК-226»; та від 29.09.2021 №466 з ФОП Мовенко С.М. (технічний нагляд) | | Договір укладено 01.10.2021. Триває процедура отримання дозволу на проведення будівельних робіт | |
| Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області | Серпень – грудень | 11 247,0 | | | Процедура закупівлі оголошена 30.09.2021. Роботи будуть розпочаті після отримання дозволу на проведення будівельних робіт | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------------------|-------------------|--|----------------|--|---|
| Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області | Листопад - грудень | 12 700,0 | Договір з ФОП Ариповський С.М. №708 від 01.10.2021 (авторський нагляд) | | Процедура закупівлі на виконання будівельних робіт оголошена 26.08.2021, визначено переможця, договір буде укладено після 04.10.2021 | |
| 2.3. інших: (враховано до вартості будівельних робіт) | | 1 067,4 | | 115,8 | | |
| 2.3.1. утримання служби замовника | | 533,7 | | 84,5 | | |
| 2.3.2. авторський нагляд | | 177,9 | Договір з ФОП Ариповський С.М. №708 від 01.10.2021 Договір з ФОП Ариповський С.М. №709 від 01.10.2021 | | | |
| 2.3.3. технічний нагляд | | 355,8 | Договір з ФОП Мовенко С.М. № 465 від 05.07.2021, №466 від 29.09.2021 | 31,3 | | |
| 3. Разом (1 + 2) | | 36 927,0 ✓ | | 3 703,6 | | |

Станом на 01.10.2021 за бюджетною програмою КПКВК 2707160 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» наказом Держводагентства від 22.04.2021 № 288 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та наказом Міндовкілля від 24.05.2021 № 336 паспорт бюджетної програми, отримано фінансування в обсязі 16 385,6 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на квітень – вересень 2021 року.


Касові видатки за бюджетною програмою складають 3 703,6 тис. грн., оскільки відповідно до укладених договорів розрахунки за надані роботи Замовник зобов'язується перерахувати кошти на поточний рахунок Виконавця протягом 30 банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) та отримання довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3).

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проєкту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

| План фінансування на 2021 рік | У тому числі за місяцями | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| | План розроблення і реалізації проєкту відповідно до державного інвестиційного проєкту (розділ III проєкту) | | | | | | | | | | | |
| 36 927,0 | | | | 2596,4 | 2744,9 | 3447,9 | 596,4 | 2000,0 | 5000,0 | 5789,1 | 6385,4 | 8366,9 |
| | Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань | | | | | | | | | | | |
| 36 927,0 ✓ | | | | 2596,4 ✓ | 2744,9 ✓ | 3447,9 ✓ | 596,4 ✓ | 2000,0 ✓ | 5000,0 ✓ | 5789,1 ✓ | 6385,4 ✓ | 8366,9 ✓ |
| | Касові видатки | | | | | | | | | | | |
| 3703,6 ✓ | | | | | | | | 2 248,8 | 1454,8 | | | |


В.о. Голови
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)


(підпис)
М. П.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ
(ініціали та прізвище)

Олександр Застуржскі
Меністра

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)


(підпис)
М. П.

Юліана Збуржовської
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.10.2021

«Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 1 485 166,44 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми 2707170 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом 5 000,0 тис. гривень ✓
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Львівдипроводгосп»
9. Інформація щодо підрядної організації ТзОВ «Гідробуд-М»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|---|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи | Квітень - листопад | 213,2 | | | | |

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання (номер договору, дата укладення) | вартість (тис. гривень) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проєктних робіт: | Квітень - листопад | 798,2 | Вересень | 422,8 | | |
| 1.1. розроблення проєктно-кошторисної документації | | 585,0 | | 357,8 | | |
| Відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с.Корналовичі до с.Кружики Самбірського району | Квітень - листопад | 365,0 | Договори від 01.09.2021 №1-09 з ФОП Думаило; від 21.09.2021 №1-2109 з ТОВ «Центр планування території»; від 21.09.2021 №95 з «Голос Самбірщини» | 202,5 | | |
| Будівництво нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської греблі Самбірського району Львівської області | Квітень - листопад | 220,0 | Договори від 02.09.2021 №28/09/21 з ФОП Романюк В.О. ; від 21.09.2021 № 96 з «Голос Самбірщини»; від 21.09.2021 №2-2109 з ТОВ «Центр планування території»; від 16.09.2021 №340-д/2021 з ФОП Білоус В.В.; від 21.09.2021 №096/08.21 з ТОВ «Центр планування території» | 155,3 | | |
| 1.2. експертиза | | | | | | |
| 1.3. затвердження проєкту | | | | | | |
| 1.4. інше (забезпечення земельною ділянкою) | | 213,2 | Договори від 28.07.2021 № 18/21 та 25/21 з ФОП Цісінський | 65,0 | | |
| 2. Проведення процедури закупівлі щодо: | | 44 495,2 | | 44 495,2 | | |
| 2.1. будівельних робіт | Квітень - листопад | 44 495,2 | | 44 495,2 | | |
| Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області | | 15 600,0 | Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТзОВ «Гідробут-М» | 15 600,0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|-----------------|---|-----------------|---|---|
| Захист с.с.Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області | | 28 895,2 | Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТЗОВ «Гідробут-М» | 28 895,2 | | |
| Разом | | 45 293,4 | | 44 918,0 | | |

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|---|---|-------------------------|--|-------------------------|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі: | Квітень - грудень | 798,2 | | 46,5 | | |
| 1.1. розроблення проектно-кошторисної документації | | 585,0 | | 9,5 | | |
| Відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с.Корналовичі до с.Кружики Самбірського району | Квітень - грудень | 365,0 | Договори від 01.09.2021 №1-09 з ФОП Думаило; від 21.09.2021 №1-2109 з ТОВ «Центр планування території»; від 21.09.2021 №95 з «Голос Самбірщини» | 5,0 | | |
| Будівництво нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської греблі Самбірського району Львівської області | Квітень - грудень | 220,0 | Договори від 02.09.2021 №28/09/21 з ФОП Романюк В.О. ; від 21.09.2021 № 96 з «Голос Самбірщини»; від 21.09.2021 №2-2109 з ТОВ «Центр планування території»; від 16.09.2021 №340-д/2021 з ФОП Білоус В.В.; від 21.09.2021 №096/08.21 з ТОВ «Центр планування території» | 4,5 | | |
| 1.2. експертиза | | | | | | |
| 1.3. затвердження проекту | | | | | | |
| 1.4. інше (забезпечення земельною ділянкою) | | 213,2 | Договір від 28.07.2021 №18/21 з ФОП Цісінський | 37,0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------------|------------------|---|---------------|--|---|
| 2. Виконання, усього, у тому числі: | | 4 201,8 | | 1073,7 | | |
| 2.1. будівельних робіт; | Квітень - грудень | 4 201,8 | | 1073,7 | | |
| Захист с.с.Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області | Квітень - грудень | 2 637,8 | Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТзОВ «Гідробут-М» | | У зв'язку з несприятливими погодними умовами (випадінням значної кількості опадів) роботи будуть розпочаті після настання сприятливих умов | |
| Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області | Квітень - грудень | 1 564,0 | Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТзОВ «Гідробут-М» | 1073,7 | | |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | | | | | | |
| 2.3. інших: (враховано до вартості будівельних робіт) | | 61,0 | | 15,2 | | |
| 2.3.1. утримання служби замовника | | - | | - | | |
| 2.3.2. авторський нагляд | | 6,4 | | - | | |
| 2.3.3. технічний нагляд тощо | | 54,6 | | 15,2 | | |
| 3. Разом (1 + 2) | | 5 000,0 ✓ | | 1120,2 | | |

Станом на 01.10.2021 наказом Держводагентства від 30.04.2021 № 322 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік.

Копія довідки про внесення змін до річного розпису бюджету на 2021 рік була надана Міндовкілля листом ДКСУ від 14.06.2021 № 8-06-06/12066.

Паспорт бюджетної програми КПКВК 2707170 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області» затверджено наказом Міндовкілля від 01.07.2021 № 435, отримано фінансування в обсязі 5 000,0 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на квітень – червень 2021 року.


11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

| План фінансування на 2021 рік | У тому числі за місяцями | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| | План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту) | | | | | | | | | | | |
| 5000,0 | | | | 2000,0 | 1851,5 | 1148,5 | | | | | | |
| | Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань | | | | | | | | | | | |
| 5000,0 | | | | 2000,0 ✓ | 1851,5 ✓ | 1148,5 ✓ | | | | | | |
| | Касові видатки | | | | | | | | | | | |
| 1120,2 | | | | | | | | 743,3 | 376,9 | | | |

В.о. Голови

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

(підпис)
М. П.Олексій КУЗЬМЕНКОВ

(ініціали та прізвище)

Вершиш Заступник
Міністра

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)
М. П.

Юліана Зверюковська
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 01.10.2021

«Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою»

(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту 103 695,9 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проєктом 10 000,0 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп», ПП «Бурводсервіс»
9. Інформація щодо підрядної організації ТОВ «Кулев-Інвест»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проєкту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проєктом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|---|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи | - | - | - | - | | |

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|--|---|-------------------------|--|---|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання (номер договору, дата укладення) | вартість (тис. гривень) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт: | Вересень - листопад | 93,7 | | 93,0 | | |
| 1.1. коригування проектно-кошторисної документації | | 93,7 | | 93,0 | | |
| Будівництво водопровідних мереж у с.Червоне Червоненської сільської ради Золочівського району | Вересень - листопад | 44,1 | Договір №023/04.21-д від 29.09.2021 | 44,0 | | |
| Будівництво водопровідних мереж у с.с.Поршна, Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району | Вересень - листопад | 49,6 | Договори від 23.09.2021 №24/04.21-д та №25/04.21-д | 49,0 | | |
| 1.2. експертиза | | | | | | |
| 1.3. затвердження проекту | | | | | | |
| 1.4. інше | | | | | | |
| 2. Проведення процедури закупівлі щодо: | | 13577,1 | | 9 074,0 | | |
| 2.1. будівельних робіт | Вересень - грудень | 13577,1 | | 9 074,0 | | |
| Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірянської сільської ради Стрийського району | | 9 074,0 | Договір №040/20 від 23.12.2020 ТОВ «Кулев-Інвест» | 9074,0 (будівельні роботи – 8900,0, технічний нагляд – 124,4, авторський нагляд – 11,3, сертифікат готовності - 11,4; ризику замовника - 26,9) | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|-----------------|---|----------------|---|---|
| Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району | Вересень | 4 503,1 | | | | |
| Разом | | 13 670,8 | | 9 167,0 | | |

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|--|---|-------------------------|--|-------------------------|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Виконання проєктних робіт, усього, у тому числі: | Вересень - грудень | 93,7 ✓ | | 49,0 ✓ | | |
| 1.1. коригування проєктно-кошторисної документації | | 93,7 ✓ | | 49,0 | | |
| Будівництво водопровідних мереж у с.Червоне Червоненської сільської ради Золочівського району | Вересень-листопад | 44,1 | Договір №023/04.21-д від 29.09.2021 | | | |
| Будівництво водопровідних мереж у с.с.Поршна, Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району | Вересень-листопад | 49,6 | Договори від 23.09.2021 №24/04.21-д та №25/04.21-д | 49,0 | | |
| 1.2. експертиза | | | | | | |
| 1.3. затвердження проєкту | | | | | | |
| 1.4. інше | | | | | | |
| 2. Виконання, усього, у тому числі: | | 9 906,3 ✓ | | 43,5 ✓ | | |
| 2.1. будівельних робіт; | Вересень - грудень | 9 906,3 | | 43,5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|-------------------|---|---------------|---|---|
| Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірнянської сільської ради Стрийського району | Вересень - грудень | 9 074,0 | Договір №040/20 від 23.12.2020 ТОВ «Кулев-Інвест» | 7,4 | | |
| Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району | Вересень - грудень | 832,3 | | 36,1 | | |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | | | | | | |
| 2.3. інших: (враховано до вартості будівельних робіт) | Вересень-грудень | 186,5 | | 43,5 | | |
| 2.3.1. утримання служби замовника | | - | | - | | |
| 2.3.2. авторський нагляд | | 15,1 | | - | | |
| 2.3.3. технічний нагляд | | 133,1 | | - | | |
| 2.3.4. ризику замовника та оплата сертифікату готовності | | 38,3 | | - | | |
| тощо | | - | | 43,5 | | |
| 3. Разом (1 + 2) | | 10 000,0 ✓ | | 92,5 ✓ | | |

Станом на 01.10.2021 наказом Держводагентства від 30.04.2021 № 323 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 18.06.2021 № 408 затверджено паспорт бюджетної програми 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою», отримано фінансування в обсязі 2 500,0 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на вересень 2021 року.

За об'єктом «Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району» було проведено додаткове коригування робочого проекту (коригування проекту - 2,5 тис. грн., експертиза проекту – 4,3 тис.грн.) та проведено комісійне обстеження залізниці для підготовки технічних умов на ділянці перетину залізниці (29,3 тис. гривень).

За об'єктом «Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірнянської сільської ради Стрийського району» було сплачено 7,4 тис. гривень адміністративного збору за реєстрацію речового права (договорів суперфіцію) для доступу на земельні ділянки при будівництві водопровідних мереж.

Триває процедура отримання дозволів на проведення будівельних робіт.


11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

| План фінансування на 2021 рік | У тому числі за місяцями | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| | План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту) | | | | | | | | | | | |
| 10 000,0 | | | | | | | | | 2500,00 | | 4000,00 | 3500,00 |
| | Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань | | | | | | | | | | | |
| 10 000,0 ✓ | | | | | | | | | 2500,00 ✓ | | 4000,00 ✓ | 3500,00 ✓ |
| | Касові видатки | | | | | | | | | | | |
| 92,5 ✓ | | | | | | | | | 92,5 ✓ | | | |

В.о. Голови

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

(підпис)
М. П.Олексій КУЗЬМЕНКОВ

(ініціали та прізвище)

Марина Заступник
Менеджера

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)
М. П.

Вікторія Барановська
(ініціали та прізвище)

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладання договорів

| Заходи | Передбачені показники державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками | Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах |
|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| | заплановані строки (дата) | вартість (тис. грн.) | строки виконання (№ договору, дата укладання) | вартість (тис. грн.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт, у тому числі: | Вересень-грудень | 4174,66 | Вересень-грудень | 320,0 | | |
| Проектні роботи. Проведення експертизи робочих проектів: | | 146,08 | | | | |
| Реконструкція споруди № 14 | | 14,22 | | | | |
| Реконструкція дамби №8 | | 52,52 | | | | |
| Реконструкція Томаківської насосної станції | | 37,53 | | | | |
| Реконструкція Базавлуцької насосної станції | | 41,81 | | | | |
| Реконструкція споруди №6 | | 110,00 | | | | |
| Реконструкція дамби №2 | | 60,00 | Договір від 29.09.2021 № 128 ДП «ПТБ» ІВПіМ НААН | 60,00 | | |
| Реконструкція дамби №4 | | 460,00 | | | | |
| Реконструкція дамби №5 | | 540,00 | | | | |
| Реконструкція Орільської захисної дамби | | 1 303,98 | | | | |
| Реконструкція Верхньодніпровської дамби | | 120,00 | | | | |
| Реконструкція Західно-Крюківської дамби | | 260,00 | Договір від 29.09.2021 № 127 ДП «ПТБ» ІВПіМ НААН | 260,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------------|------------------|--|------------------|---|---|
| Реконструкція Кременчуцьких насосних станцій №1-5 | | 1 174,60 | | | | |
| 2. Проведення процедури закупівлі щодо: | Липень - вересень | | Вересень | | | |
| 2.1. будівельних робіт | | 80 716,38 | | 79 637,74 | | |
| Реконструкція Кам'янської захисної дамби | | 25 890,9 | Договір №144 від 16.08.2019 ТОВ «СІГМА ГРУП» | 25 890,9 | | |
| Реконструкція Нікопольської компресорної станції | Липень | 2 509,86 | Договір від 15.09.2021 №15 ТОВ «ГІДРОБУДІІМІТЕД» | 2 509,86 | | |
| Реконструкція Нікопольської захисної дамби | Серпень | 52 315,62 | Договір від 29.09.2021 №129 ТОВ «Будівельна компанія «Дрім-Хаус» | 51 236,98 | | |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | | | | | | |
| 2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт): | | 554,12 | | 294,59 | | |
| 2.3.1. утримання служби замовника | | | | | | |
| 2.3.2. авторський нагляд | | 161,09 | Договір від 29.09.2021 № 21049 ДРПВІ «Укрпівдендипроводгосп» | 144,59 | | |
| 2.3.3. технічний нагляд | | 393,03 | Договір від 01.10. 2021 № 130 ФОП Ляшенко Є.В. | 150,00 | | |
| Разом: | | 84 891,04 | | 79 957,74 | | |

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

| Заходи | Передбачені показники державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками | Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах |
|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| | заплановані строки (дата) | вартість (тис. грн.) | строки виконання | вартість (тис. грн.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Виконання проектних робіт, всього: | Жовтень - грудень | 4174,66 ✕ | | | | |
| Проектні роботи. Проведення експертизи робочих проектів: | | 146,08 ✓ | | | | |
| Реконструкція споруди № 14 | | 14,22 | | | | |
| Реконструкція дамби №8 | | 52,52 | | | | |
| Реконструкція Томаківської насосної станції | | 37,53 | | | | |
| Реконструкція Базавлуцької насосної станції | | 41,81 | | | | |
| Реконструкція споруди №6 | | 110,00 | | | | |
| Реконструкція дамби №2 | | 60,00 | Договір від 29.09.2021 № 128 ДП «ПТБ» ІВПІМ НААН | | | |
| Реконструкція дамби №4 | | 460,00 | | | | |
| Реконструкція дамби №5 | | 540,00 | | | | |
| Реконструкція Орільської захисної дамби | | 1 303,98 | | | | |
| Реконструкція Верхньодніпровської дамби | | 120,00 | | | | |
| Реконструкція Західно-Крюківської дамби | | 260,00 | Договір від 29.09.2021 № 127 ДП «ПТБ» ІВПІМ НААН | | | |
| Реконструкція Кременчуцьких насосних станцій №1-5 | | 1 174,60 | | | | |
| 2. Виконання, усього, у тому числі: | Липень – грудень | 35 825,34 ✓ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|------------------|-------------------|--|---|--|---|
| 2.1. будівельних робіт: | | | | | | |
| Реконструкція Кам'янської захисної дамби | Липень-грудень | 5 514,56 | Договір №144 від 16.08.2019 ТОВ «СІГМА ГРУП» | | Тривають будівельні роботи. Акти виконаних робіт не надходили | |
| Реконструкція Нікопольської компресорної станції | Липень-грудень | 2 509,86 | Договір від 15.09.2021 №15 ТОВ «ГІДРОБУДЛІМІТЕД» | | Тривають будівельні роботи. Акти виконаних робіт не надходили | |
| Реконструкція Нікопольської захисної дамби | Вересень-грудень | 27 800,92 | Договір від 29.09.2021 №129 ТОВ «Будівельна компанія «Дрім-Хаус» | | Триває процедура отримання дозволу на проведення будівельних робіт | |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | | | | | | |
| 2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт): | | 554,12 ✓ | | | | |
| 2.3.1. утримання служби замовника | | | | | | |
| 2.3.2. авторський нагляд | | 161,09 | Договір від 29.09.2021 № 21049 ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп» | | | |
| 2.3.3. технічний нагляд | | 393,03 | Договір від 01.10. 2021 № 130 ФОП Ляшенко Є.В. | | | |
| 3.Разом: (1+2) | | 40 000,0 ✓ | | | | |

Станом на 01.10.2021 затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік наказом Держводагентства від 27.07.2021 № 540 та наказом Міндовкілля від 18.08.2021 № 550 паспорт бюджетної програми КПКВК 2707800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ», отримано фінансування в обсязі 8 289,1 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на липень – вересень 2021 року.

Тривають будівельні роботи на перехідних об'єктах. Станом на 01.10.2021 акти виконаних робіт не надходили. Оплата буде здійснена після надходження Акту приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) та отримання довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3).

11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проєкту у поточному році за місяцями

(тис. грн.)

| План фінансування на 2021 рік | у тому числі за місяцями | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| | План розробки (реалізації) проєкту відповідно до державного інвестиційного проєкту (розділ III проєкту) | | | | | | | | | | | |
| 40 000,0 | | | | | | | 4000,0 | 2596,4 | 1692,7 | 8000,0 | 8000,0 | 15710,9 |
| | Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування | | | | | | | | | | | |
| 40 000,0 | | | | | | | 4000,0 ✓ | 2596,4 ✓ | 1692,7 ✓ | 8000,0 ✓ | 8000,0 ✓ | 15710,9 ✓ |
| | Касові видатки | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

В.о. Голови
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)



(підпис)
М. П.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ
(ініціали та прізвище)

Сержань Заступник
Міністра

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



(підпис)
М. П.

Юлія Заступник
(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.10.2021р. ✓

(число, місяць, рік)

«Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття» -

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України ✓
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство України з управління зоною відчуження ✓
3. Найменування замовника Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» ✓
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська область, 07100
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) (тис. гривень) 778 939 тис. гривень ✓
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 63 477 тис. гривень ✓
8. Інформація щодо проектної організації Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут», інші проектні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII ✓
9. Інформація щодо підрядної організації
Товариство з обмеженою відповідальністю «Домобудівний комбінат-7», вул. Колекторна 17, м.Київ, Київська обл., Україна, 02121, код за ЄДРПОУ 38526328; ✓
Приватне акціонерне товариство «Енергопромінвест», вул. Дегтярівська, буд. 25-А, літера Л, м.Київ, Київська обл., Україна, 04119, код за ЄДРПОУ 24569259; ✓
Приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж», проспект Лісовий 39, м.Київ, Київська обл., Україна, 02166, код за ЄДРПОУ 16403289; ✓
інші підрядні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|---|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи | - | - | - | - | - | - |

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|--|---|-------------------------|---|---|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання (номер договору, дата укладення) | вартість (тис. гривень) | | |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт: | Серпень-грудень | 2 200,0 | | 2 199,9*(з них на 2021 рік 1719,9) | | |
| 1.1. коригування ПКД | | | | | | |
| 1.2. розроблення робочого проекту | | | | | | |
| «Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС» | Серпень-грудень | 1 720,0 | Договір №3019325 від 24.12.2019 Додаткова | 2 199,9*/1719,9** (які передбачені на 2021 рік) | Договір №3019325 від 24.12.2019 укладений на суму 2 199,9 тис. гривень, з них в 2020 році за рахунок власних коштів | |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|-------------------------|--|--|---|
| | | | угода №2 від 02.11.2020 | | підприємства було сплачено 480,0 тис. гривень. Враховуючи зазначене вище, було підписано додаткову угоду №2 від 02.11.2020, якою на 2021 рік передбачено фінансування в обсязі 1719,9 тис. гривень. Таким чином відбулась економія коштів в сумі 480,1 тис. гривень. | |
| 1.3. експертиза | | | | | | |
| «Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС» | Серпень-грудень | 480,0 | | | | |
| 1.4. затвердження проекту | | | | | | |
| 1.5. інше | | | | | | |
| 2. Проведення процедури закупівлі щодо: | Квітень-грудень | 61 277,0 | | 158 256,7*/ 157 483,9** (з них на 2021 рік 21 357,06) | | |
| 2.1. будівельних робіт (в тому числі авторський нагляд) | | 61 277,0 | | 158 256,7*/ 157 483,9** (з них на 2021 рік 21 357,06) | | |
| «Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод» | Травень-грудень | 19 551,0 | | | Торги на виконання будівельних робіт по даному об'єкту не проводились в зв'язку з необхідністю внесення змін до III розділу державного інвестиційного проєкту, що надасть можливість здійснити в 2021 році закупівлю | Проведено відкриті торги з публікацією англійською мовою на закупівлю вакуумної випарної установки. Заключено договір на поставку обладнання №21-0426-2 від 09.08.2021 з ЗАТ «LOKMIS» на суму |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|--|---|--|--|
| | | | | | обладнання, а саме вакуумну випарну установку. | 31 700,0 тис. гривень. |
| «Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС» | Квітень-грудень | 19 349,0 | | | Будівельні роботи в 2021 році не можливо розпочати в зв'язку з незакінченими роботами по розробленні проектної документації та великим терміном проведення експертизи проекту і погодження його з ДЯРУ. | |
| «Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС» | Серпень-листопад | 12 970,0 | Договір №89 від 28.07.2017 Додаткова угода №17 від 13.07.2020 | 128 959,6*/ 128 314,3** (з них на 2021 рік 11 626,9) | За раніше укладеним договором вартість договору становила 128 959,6 тис. гривень, за результатом укладеної додаткової угоди №17 від 13.07.2020 вартість договору знизилась до 128 314,3 тис. гривень, за рахунок внесення змін до специфікації обладнання, яке постачається підрядною організацією, в частині уточнення найменувань необхідного обладнання. Таким чином відбулась економія коштів за договором в сумі 645,3 тис. гривень. Будівельні роботи в 2021 році не розпочаті в зв'язку з необхідністю проведення коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи | Заклучено договір на коригування робочого проекту №02/13-ПВР від 10.03.2021 на суму 589,86 тис. гривень. |

| | | | | | проекту. | |
|---|------------------|---------|---|---|--|--|
| | | 30,0 | Договір №03/2017 від 29.08.2017 (авторський нагляд) | 15,4* (з них на 2021 рік 2,46) | | |
| «Технічне переоснащення СВЯП-1 в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв'язку, КВПтаА» | Листопад-грудень | 8 547,0 | Договір №19-05 від 14.05.2018 Додаткова угода №7 від 02.12.2020 | 13 422,8* (з них на 2021 рік 9 160,13) | Додатковою угодою №7 від 02.12.2020 до договору на 2021 рік передбачено фінансування в обсязі 9 160,13 тис. гривень, що фактично складає на 613,13 тис. гривень більше ніж заплановано в державному інвестиційному проєкті, за рахунок невиконаних обсягів робіт запланованих додатковими угодами №5 від 27.09.2019 та №6 від 13.12.2019 в 2020 році. Планується підписання нової додаткової угоди. Будівельні роботи в 2021 році не розпочаті в зв'язку з необхідністю проведення коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи проєкту. | Заклучено договір на коригування робочого проєкту №3021128 від 11.03.2021 на суму 1 139,87 тис. гривень. |
| | | 30,0 | Договір №301805 від 20.06.2018 Додаткова угода №5 від 01.06.2021 (авторський нагляд) | 20,8*/ 24,3** (з них на 2021 рік 3,47) | За раніше укладеним договором вартість договору становила 20,8 тис. гривень, за результатом укладеної додаткової угоди №5 від 01.06.2021 вартість договору збільшилась до | |

| | | | | | | |
|--|---------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | 24,3 тис. гривень, за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати. Таким чином відбулось збільшення вартості за договором на суму 3,5 тис. гривень. | |
| «Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС» | Квітень | 789,6 | Договір №18 від 30.08.2018 | 15 774,5*/ 15 643,5** (з них на 2021 рік 553,7) | За раніше укладеним договором вартість договору становила 15 774,5 тис. гривень. Станом на 04.08.2021 договір №18 від 30.08.2018 на виконання будівельних робіт виконаний, сума оплати за договором склала 15 643,5 тис. гривень (з них у 2021 році сплачено 553,7 тис. гривень). Вартість договору знизилась за рахунок внесення змін до специфікації обладнання яке постачається підрядною організацією. Таким чином відбулась економія коштів за договором в сумі 131,0 тис. гривень. | |
| | | 10,4 | Договір №301801 від 14.09.2018 (авторський нагляд) | 63,6* (з них на 2021 рік 10,4) | Договір №301801 від 14.09.2018 на здійснення авторського нагляду виконаний в повному обсязі, сума оплати за договором в 2021 році склала 10,4 тис. гривень. | |
| 2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 159 683,8** (з них на 2021 рік 23 076,96) | |
|--|--|--|--|---|--|

* Загальна вартість укладених договорів.

** Загальна вартість укладених договорів з урахуванням додаткових угод, в тому числі виконаних договорів.

***Паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття» затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №362 від 31.05.2021.

Інформація щодо виконання

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| 1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі: | Квітень-грудень | 2 200,0 | Квітень-грудень | 360,0 | | |
| 1.1. коригування | | | | | | |
| 1.2. розроблення робочого проекту | | | | | | |
| «Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС» | | 1 720,0 | | 360,0 | Відповідно до календарного плану робіт за договором №3019325 від 24.12.2019 (в т.ч. додаткової угоди №2 від 02.11.2020) виконані роботи щодо розроблення Звіту з оцінки впливу на довкілля (ЗОВД) на суму 360,0 тис. грн.(акт здачі- | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|---|--|
| | | | | | довкілля (ЗОВД) на суму 360,0 тис. грн.(акт здачі-приймання виконаних робіт №2 від 10.09.2021). | |
| 1.3. експертиза | | | | | | |
| «Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС» | | 480,0 | | 0,0 | | |
| 1.4. затвердження проекту | | | | | | |
| 1.5. інше | | | | | | |
| 2. Виконання, усього, у тому числі: | Квітень-грудень | 61 277,0 ✓ | Квітень-грудень | 564,1 ✓ | | |
| 2.1. будівельних робіт; | | 61 277,0 | | 564,1 | | |
| «Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод» | | 19 551,0 | | 0,0 | | |
| «Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС» | | 19 349,0 | | 0,0 | | |
| «Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС» | | 13 000,0 | | 0,0 | | |
| «Технічне переоснащення СВЯП-1 в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв'язку, КВПтаА» | | 8 577,0 | | 0,0 | | |
| «Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС» | | 800,0 | | 564,1 | Договір №18 від 30.08.2018 на виконання будівельних робіт виконаний, сума оплати за договором в 2021 році склала 553,7 тис. гривень. Договір №301801 від | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|----------------|---|--|
| | | | | | 14.09.2018 на здійснення авторського нагляду за будівництвом виконаний в повному обсязі, оплата за договором в 2021 році склала 10,4 тис. гривень. Таким чином відбулась економія бюджетних коштів передбачених державним інвестиційним проектом в 2021 році в обсязі 235,9 тис. гривень. | |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | | | | | | |
| 2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт): | | | | | | |
| 2.3.1. утримання служби замовника | | | | | | |
| 2.3.2. авторський нагляд (по трьох заходах) | | 70,4 | | 10,4 | Договір №301801 від 14.09.2018 на здійснення авторського нагляду за будівництвом об'єкту «Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС» виконаний в повному обсязі, оплата за договором в 2021 році склала 10,4 тис. гривень. | |
| 2.3.3. технічний нагляд | | | | | | |
| 3. Разом: (1+2) | | 63 477,0 ✓ | | 924,1 * | | |

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

| План фінансування на 2021 рік | У тому числі за місяцями | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|------------|
| | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту) | | | | | | | | | | | | |
| 63 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 7 207,9 | 6 523,9 | 7 523,9 | 7 223,9 | 0,0 | 300,0 | 9 000,0 | 24 397,4 |
| Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань | | | | | | | | | | | | |
| 63 477,0 ✓ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 ✓ | 7 207,9 ✓ | 6 523,9 ✓ | 7 523,9 ✓ | 7 223,9 ✓ | 0,0 ✓ | 300,0 ✓ | 9 000,0 ✓ | 24 397,4 ✓ |
| Касові видатки | | | | | | | | | | | | |
| 924,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 546,2 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Станом на 01.10.2021 за бюджетною програмою КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття» отримано фінансування в обсязі 29 779,6 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на квітень-вересень 2021 року.

Станом на 01.10.2021 касові видатки за бюджетною програмою складають 924,1 тис. гривень, в зв'язку з необхідністю внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту та схвалення даних змін на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, а також необхідністю внесення відповідних зміни до чинного законодавства для здійснення закупівлі коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод».

Т.в.о. Голова ДАІВ

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

Вересий заступник Міністра

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



(підпис)

М. П.



(підпис)

М. П.

Є.Г. Крамаренко

(ініціали та прізвище)

Ю. Боруховська

(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.10.2021р.

(число, місяць, рік)

«Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта «Укриття»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство України з управління зоною відчуження
3. Найменування замовника будівництва Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська область, 07100
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) 4 704 468 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об'єкта «Укриття»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 87 000 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації
Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», вул. Івана Клименка 5/2, м.Київ-37, Україна, 03037, код за ЄДРПОУ 02495431;
Державний вищий навчальний заклад «Дніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Івана Чернишевського 24а, м. Дніпро, Україна, 49600, код за ЄДРПОУ 02070772;
Приватне акціонерне товариство «Київський НДПКІ «Енергопроект», пр. Перемоги 4, м.Київ, Україна, 01135, код за ЄДРПОУ 16392628;
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», вул. Леся Качинського буд.3, м.Буча, Київська область, Україна, 08292, код за ЄДРПОУ 30568931;
інші проектні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII
9. Інформація щодо підрядної організації Підрядна організація не визначена
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|---|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи | – | – | – | – | – | – |

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|---|---|-------------------------|---|--|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання (номер договору, дата укладення) | вартість (тис. гривень) | | |
| 1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт | Квітень - листопад | 10 929,0 * | | 66 489,0 (з них на 2021 рік 11 393,0) * | | |
| 1.1. коригування ПКД | | | | | | |
| 1.2. розроблення робочого проекту | | | | | | |
| «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій | Квітень-жовтень | 8 903,0 * | Договір №823-114 від | 63 999,0 (з них на 2021 рік 8 903,0) ✓ | Проведено відкриті торги. Заключено договір на розроблення | |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу» | | | 07.07.2021 | | робочого проекту з ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ». | |
| «Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огорожувального контуру НБК» | Травень-листопад | 1 701,0 | Договір №569 від 09.10.2020 | 2 490,0 (які передбачені на 2021 рік) | В зв'язку з відсутністю фінансування проекту в минулих періодах фактична вартість виконання проектних робіт збільшилась внаслідок інфляції та підвищення мінімальної заробітної плати. Згідно з проведеними тендерними процедурами в 2020 році, укладено договір на виконання проектних робіт №569 від 09.10.2020 на суму 2490,0 тис. гривень. Таким чином відбулось збільшення вартості проектних робіт за договором на суму 789,0 тис. гривень. Необхідне внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту. | |
| 1.3. експертиза | | | | | | |
| «Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огорожувального контуру НБК» | Травень-листопад | 325,0 ✓ | | | | |
| 1.4. затвердження проекту | | | | | | |
| 1.5. інше | | | | | | |
| 2. Проведення процедури | Квітень- | 76 071,0 ✓ | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| закупівлі щодо : | грудень | | | | | |
| 2.1. будівельних робіт | | | | | | |
| 2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | | | | | | |
| «Реконструкція об'єкта «Укриття» в частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі» | Квітень-грудень | 76 071,0 | | | Відкриті торги з закупівлі дистанційно-керованого робота-маніпулятора не відбулися (відмінені) в зв'язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Дата відміни торгів 23.07.2021. Необхідне внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту. | Проводяться роботи щодо оголошення торгів із застосуванням переговорної процедури закупівлі. |
| 2.3. інших заходів | | | | | | |
| Разом: | | 87 000,0 | | 66 489,0 (з них на 2021 рік 11 393,0) | | |

*Паспорт бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об'єкта «Укриття» затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №361 від 31.05.2021.

Інформація щодо виконання

| Назва заходу | Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом | | Фактичні показники | | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками | Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах |
|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|--|
| | строки | вартість (тис. гривень) | строки виконання | вартість (тис. гривень) | | |
| 1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі: | Квітень-грудень | 10 929,0 | Квітень-грудень | 0,0 | | |
| 1.1 коригування ПКД | | | | | | |
| 1.1. розроблення робочого проекту | | | | | | |
| «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу» | | 8 903,0 | | 0,0 | | |
| «Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огорожувального контуру НБК» | | 1 701,0 | | 0,0 | | |
| 1.3. експертиза | | | | | | |
| «Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огорожувального контуру НБК» | | 325,0 | | 0,0 | | |
| 1.4. затвердження проекту | | | | | | |
| 1.5. інше | | | | | | |
| 2. Виконання, усього, у тому числі: | Квітень - Грудень | 76 071,0 | Квітень-грудень | 0,0 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|------------|--|--|
| 2.1. будівельних робіт | | | | | | |
| 2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю | | | | | | |
| «Реконструкція об'єкта «Укриття» в частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі» | | 76 071,0 | | 0,0 | | |
| 2.3. інших: 2.3.1. утримання служби замовника 2.3.2. авторський нагляд 2.3.3. технічний нагляд тощо | | | | | | |
| 3. Разом (1 + 2) | | 87 000,0 ✓ | | 0,0 | | |

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями
(тис. гривень)

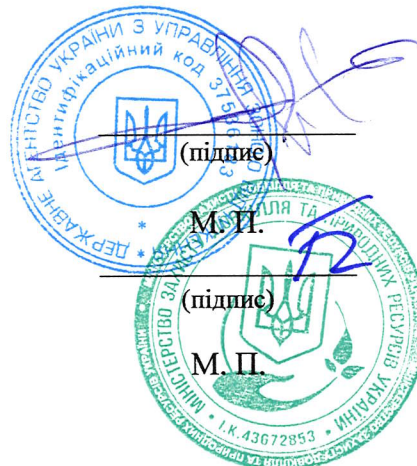
| План фінансування на 2021 рік | У тому числі за місяцями | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту) | | | | | | | | | | | | |
| 87 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 223,9 | 316,0 | 1 000,0 | 0,0 | 300,0 | 15 047,7 | 22 271,6 | 21 095,4 | 20 745,4 |
| Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань | | | | | | | | | | | | |
| 87 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 223,9 | 316,0 | 1 000,0 | 0,0 | 300,0 | 15 047,7 | 22 271,6 | 21 095,4 | 20 745,4 |
| Касові видатки | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Станом на 01.10.2021 за бюджетною програмою КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об'єкта «Укриття» отримано фінансування в обсязі 22 887,6 тис. гривень відповідно до помісячного обсягу асигнувань на квітень-вересень 2021 року.

Станом на 01.10.2021 касові видатки за бюджетною програмою складають 0,0 гривень, в зв'язку з необхідністю внесення змін до III розділу державного інвестиційного проекту та схвалення даних змін на засіданні Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, а також необхідністю внесення відповідних зміни до чинного законодавства для здійснення закупівлі коштовного іноземного обладнання, яке буде використано для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція об'єкта «Укриття» в частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі».

Т.в.о. Голози ДАЗВ
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

Сергій Дмитрович Лисенко
(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



Є.Г. Крмаренко
(ініціали та прізвище)

Б.Борисович
(ініціали та прізвище)
