



Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладання договорів

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання (№ договору, дата укладання)	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт, у тому числі:</b>		<b>4174,66</b>				
Проектні роботи. Проведення експертизи робочих проектів:	Квітень - жовтень	146,08				
<i>Реконструкція споруди № 14</i>		14,22				
<i>Реконструкція дамби №8</i>		52,52				
<i>Реконструкція Томаківської насосної станції</i>		37,53				
<i>Реконструкція Базавлуцької насосної станції</i>		41,81				
Реконструкція споруди №6		110,00				
Реконструкція дамби №2		60,00				
Реконструкція дамби №4		460,00				
Реконструкція дамби №5		540,00				
Реконструкція Орільської захисної дамби		1 303,98				
Реконструкція Верхньодніпровської дамби		120,00				
Реконструкція Західно-Крюківської дамби		260,00				
Реконструкція Кременчуцьких насосних станції №1-5		1 174,60				

1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Проведення процедури закупівлі щодо:</b>	Квітень - вересень					
2.1. Будівельних робіт		5 482,48				
Реконструкція захисної дамби Кам'янської		25 890,9	Договір №144 від 16.08.2019 ТОВ СІГМА ГРУП	25 890,9		
Реконструкція Нікопольської компресорної станції		2 509,86				
Реконструкція Нікопольської захисної дамби		52 315,62				
2.2. Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт):		554,12				
2.3.1. утримання служби замовника						
2.3.2. авторський нагляд		161,09				
2.3.3. технічний нагляд		393,03				
<b>Разом:</b>		<b>59 000,14</b>				



Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	заплановані строки і строки (дата)	вартість (тис. грн.)	строки виконання	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Виконання проектних робіт, всього:</b>	Жовтень - грудень	<b>4174,66</b>				
Проектні роботи. Проведення експертизи робочих проектів:		146,08				
<i>Реконструкція споруди № 14</i>		14,22				
<i>Реконструкція дамби №8</i>		52,52				
<i>Реконструкція Томаківської насосної станції</i>		37,53				
<i>Реконструкція Базавлуцької насосної станції</i>		41,81				
Реконструкція споруди №6		110,00				
Реконструкція дамби №2		60,00				
Реконструкція дамби №4		460,00				
Реконструкція дамби №5		540,00				
Реконструкція Орільської захисної дамби		1 303,98				
Реконструкція Верхньодніпровської дамби		120,00				
Реконструкція Західно-Крюківської дамби		260,00				
Реконструкція Кременчуцьких насосних станцій №1-5		1 174,60				
2. Виконання, усього, у тому числі:	Листопад - грудень	<b>35 825,34</b>				
2.1. Будівельних робіт:						
Реконструкція Кам'янської захисної дамби		5 514,56				



1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція Нікопольської компресорної станції		2 509,86				
Реконструкція Нікопольської захисної дамби		27 800,92				
2.2. Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт):		554,12				
2.3.1. утримання служби замовника						
2.3.2. автормський нагляд		161,09				
2.3.3. технічний нагляд		393,03				
<b>3.Разом: (1+2)</b>		<b>40 000,0</b>				

Станом на 01.04.2021 не затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КПКВК 2707800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ», оскільки Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 379, передбачено погодження пропозицій щодо реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік з басейновими радами.

Пропозиції Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, щодо реалізації інвестиційного проекту на поточний рік погоджені на засіданні Басейнної ради нижнього Дніпра (протокол від 24.03.2021).

План заходів з реалізації державного інвестиційного проекту «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» листом Держводагентства від 30.03.2021 № 1698/4/10/11-21 направлено на погодження до Міндовкілья.

## 11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями


(тис. грн.)

План фінансування на 2021 рік	у тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
40 000,0	План розробки (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
						4000,0	2596,4	1692,7	8000,0	8000,0	8000,0	15710,9
40 000,0	Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування											
						4000,0	2596,4	1692,7	8000,0	8000,0	8000,0	15710,9
	Касові видатки											

ГОЛОВА  
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

  
(підпис)  
М. П.

Валентин ШЛХТА  
(ініціали та прізвище)

  
(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

  
(підпис)  
М. П.

  
(ініціали та прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

### про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.04.2021

«Заходи із забезпечення комплексного протипавождкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»  
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 1 485 166,44 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми 2707170 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипавождкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом 5 000,0 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Львівдіпроводгосп»
9. Інформація щодо підрядної організації ТзОВ «Гідробуд-М»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

#### Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	Квітень - листопад	213,2				



Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:</b>	Квітень - листопад	<b>798,2</b>				
1.1. розроблення проектно-кошторисної документації		585,0				
Відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с.Корналовичі до с.Кружики Самбірського району		365,0				
Будівництво нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської греблі Самбірського району Львівської області		220,0				
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше (забезпечення земельною ділянкою)		213,2				
<b>2. Проведення процедури закупівлі щодо:</b>		<b>44 495,2</b>		<b>44 495,2</b>		
2.1. будівельних робіт	Квітень - листопад	44 495,2		44 495,2		
Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		15 600,0	Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТзОВ «Гідробут-М»	15 600,0		

1	2	3	4	5	6	7
Захист с.с.Ралівка, Задністря від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		28 895,2	Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТзОВ «Гідробут-М»	28 895,2		
<b>Разом</b>		<b>45 293,4</b>		<b>44 495,2</b>		

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:</b>	Квітень - грудень	<b>798,2</b>				
1.1. розроблення проектно-кошторисної документації		585,0				
Відновлення лівобережної дамби на ділянці довжиною 3,2 км від с.Корналовичі до с.Кружики Самбірського району		365,0				
Будівництво нижнього б'єфу паводкового водозабору в районі Долобівської греблі Самбірського району Львівської області		220,0				
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше (забезпечення земельною ділянкою)		213,2				

1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Виконання, усього,</b>		<b>4 201,8</b>				
<b>у тому числі:</b>						
2.1. будівельних робіт;	Квітень - грудень	4 201,8				
Захист с.с.Ралівка, Задністря від загоплення паводковими водами р.Дністер		2 637,8	Договір №174/06-2018 від 14.12.2018 з ТзОВ «Гідробут-М»			
Самбірського району Львівської області						
Захист с.с.Калинів, Кружики від загоплення водами р.Дністер Самбірського району Львівської області		1 564,0	Договір №2019-114/06 від 03.09.2019 з ТзОВ «Гідробут-М»			
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших:		61,0				
<i>(враховано до вартості будівельних робіт)</i>						
2.3.1. утримання служби замовника		-				
2.3.2. авторський нагляд		6,4				
2.3.3. технічний нагляд		54,6				
тощо						
<b>3. Разом (1 + 2)</b>		<b>5 000,0</b>				

Станом на 01.04.2021 не затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КПКВК 2707170 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області», оскільки Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 379, передбачено погодження пропозицій щодо реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік з басейновими радами Дністра і Західного Бугу та Сяну.

Пропозиції БУВР Західного Бугу та Сяну, щодо реалізації інвестиційного проекту на поточний рік погоджені на засіданні басейнної ради річок Західного Бугу та Сяну (протокол від 16.12.2020 № 2). Враховуючи обмежувальні заходи на період карантину, засідання басейнної ради Дністра у 2021 році не відбувались, перше засідання заплановано на 09.04.2021.

Враховуючи наведене, проект плану заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КПКВК 2707170 буде надіслано на розгляд до Міндовкілля після погодження пропозицій щодо реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік з басейнною радою Дністра.




11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
5000,0	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
5000,0	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
	Касові видатки											

ГОЛОВА  
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)



Валентин ШИХТА  
(ініціали та прізвище)

Вершині Василь  
Мікієнко

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



Віра  
Дарина  
(ініціали та прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

### про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.04.2021

«Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 77 370.0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми 2707160 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом 36 927.0 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації: ФОП Ариповський С.М. (1 об'єкт)
9. Інформація щодо підрядної організації: ТОВ «БВК ПМК-226» (1 об'єкт)
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

#### Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи						

Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процесу закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. грн.)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Проведення процесу закупівлі щодо проектних робіт:</b>	Квітень - травень	<b>1 350,0</b>				
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		180,0				
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		210,0				
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від смт. Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		460,0				



1	2	3	4	5	6	7
Розробка ПКД на «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		500,0				
<b>2. Проведення процедури закупівлі шодо:</b>	Червень – серпень					
2.1. Будівельних робіт		<b>37 291,8</b>				
Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області		4 156,8	Договір №1200 від 06.12.2019 ТОВ «БВК ПМК-226»	4 156,8		
Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		3 700,00				
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт. Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		4 670,00				
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		12 065,00				

1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція частини водогону від смт. Казанка до с. Володимирівка: відгалуження до с. Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		12 700,00				
2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт):		1 067,4				
2.3.1. утримання служби замовника		533,7				
2.3.2. авторський нагляд		177,9				
2.3.3. технічний нагляд		355,8				
<b>3. Разом (1 + 2)</b>		<b>38 641,8</b>				

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:</b>	Квітень - травень	<b>1 350,0</b>				
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		180,0				

1	2	3	4	5	6	7
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт.Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		210,0				
Розробка ПКД «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		460,0				
Розробка ПКД на «Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області» Проходження експертизи проекту		500,0				
<b>2. Виконання, усього, у т. ч.</b>	Червень - грудень	<b>35 577,0</b>				
2.1. будівельних робіт: Реконструкція промивного та напірного трубопроводів на очисних спорудах Казанківського групового водопроводу Новобузького району Миколаївської області		3 260,0				
Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		3 700,0				



1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція частини водогону від НС 3-го підйому до смт.Казанка (відгалуження на смт.Казанка) Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		4 670,0				
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		11 247,0				
Реконструкція частини водогону від смт.Казанка до с.Володимирівка: відгалуження до с.Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області		12 700,0				
2.3. інших: (враховано до вартості будівельних робіт)		1 067,4				
2.3.1. утримання служб за замовника		533,7				
2.3.2. авторський нагляд		177,9				
2.3.3. технічний нагляд		355,8				
<b>3. Разом (1 + 2)</b>		<b>36 927,0</b>				

Станом на 01.04.2021 не затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КПКВК 2707160 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області».

План заходів з реалізації державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» листом Держводагентства від 23.03.2021 № 1518/4/10/11-21 направлено на погодження до Міндовкільдя.

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями (тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
36 927,0	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
		2596,4	2744,9	3447,9	596,4	2000,0	5000,0	5789,1	6385,4	8366,9		
36 927,0	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
		2596,4	2744,9	3447,9	596,4	2000,0	5000,0	5789,1	6385,4	8366,9		
	Касові виплатки											

Голова  
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

*Ольга Іванівна*  
*Мікієнко*

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



Валентин ШЛІХТА  
(ініціали та прізвище)

*Вікторія Степанівна*  
(ініціали та прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

### про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.04.2021

«Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство водних ресурсів України
3. Найменування замовника Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту 103 695,9 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою»
7. Запланований обсяг витратів за бюджетною програмою за проектом 10 000,0 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації ДРПВІ «Укріплендіпроект», ПП «Бурводсервіс»
9. Інформація щодо підрядної організації ТОВ «Кулев-Інвест»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

#### Таблиця 1. Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-		



Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.1. коригування проектно-кошторисної документації	Вересень - листопад	93,7				
Будівництво водопровідних мереж у с.Червоне Червоноенської сільської ради Золочівського району		44,1				
Будівництво водопровідних мереж у с.с.Поршна, Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району		49,6				
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше						
<b>2. Проведення процедури закупівлі щодо:</b>		<b>13 577,1</b>				
2.1. будівельних робіт	Вересень - грудень	13 577,1				
Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірянської сільської ради Стрийського району		9 074,0	Договір №040/20 від 23.12.2020	9074,0 (будівельні роботи - 8900,0, технічний нагляд - 124,4, авторський нагляд - 11,3, сертифікат готовності - 11,4, ризики замовника - 26,9)		

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району		4 503,1				
<b>Разом</b>		<b>13 670,8</b>				

Таблиця 3. Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом			Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	3	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:</b>	<b>Вересень - грудень</b>	<b>93,7</b>					
1.1. коригування проектно-кошторисної документації		93,7					
Будівництво водопровідних мереж у с.Червоне Червоненської сільської ради Золочівського району		44,1					
Будівництво водопровідних мереж у с.с.Поршна, Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району		49,6					
1.2. експертиза							
1.3. затвердження проекту							
1.4. інше							
<b>2. Виконання, усього, у тому числі:</b>		<b>9 906,3</b>					
2.1. будівельних робіт;	Вересень - грудень	9 906,3					

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне Гірянської сільської ради Стрийського району		9 074,0				
Будівництво водопровідних мереж у с.Кам'янобрід Кам'янобрідської сільської ради Яворівського району		832,3				
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших:	Вересень- грудень	186,5				
<i>(враховано до вартості будівельних робіт)</i>						
2.3.1. утримання служби замовника		-				
2.3.2. авторський нагляд		15,1				
2.3.3. технічний нагляд		133,1				
2.3.4. ризики замовника та оплата сертифікату готовності тощо		38,3				
<b>3. Разом (1 + 2)</b>		<b>10 000,0</b>				

Станом на 01.04.2021 не затверджено план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КПКВК 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у переліку видатків вказана нова бюджетна програма 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою».

Міністерство фінансів не розглядає паспорт за вказаною бюджетною програмою без наявності Порядку використання коштів.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 289 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами».

Зазначеним Порядком передбачено погодження пропозицій щодо реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік з басейновими радами.

Враховуючи наведене, проект плану заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та проект паспорта бюджетної програми КПКВК 2707810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою» буде надіслано на розгляд до Міндовклпи після погодження пропозицій щодо реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік з басейновою радою Західного Буту та Сяну.



11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями


(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
10 000,0	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
10 000,0	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
10 000,0									2500,00		4000,00	3500,00
	Касові видатки											

ГОЛОВА  
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

*Олександр Демурин*  
*Міністер*

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



ВАЛЕНТИН ШПХТА  
(ініціали та прізвище)

*Валентин Шпхт*  
(ініціали та прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.04.2021р.

(число, місяць, рік)

«Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство України з управління зоною відчуження
3. Найменування замовника Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська область, 07100
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) (тис. гривень) 778 939 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 63 477 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут», інші проектні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII
9. Інформація щодо підрядної організації  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Домобудівний комбінат-7», вул. Колекторна 17, м.Київ, Київська обл., Україна, 02121, код за ЄДРПОУ 38526328;  
Приватне акціонерне товариство «Енергопромінвест», вул. Дегтярівська, буд. 25-А, літера Д, м.Київ, Київська обл., Україна, 04119, код за ЄДРПОУ 24569259;  
Приватне акціонерне товариство «Укренергомонтаж», проспект Лісовий 39, м.Київ, Київська обл., Україна, 02166, код за ЄДРПОУ 16403289;  
інші підрядні організації будуть визначені згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII



## 10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

## Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

## Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:</b>	<b>Квітень-грудень</b>	<b>2 200,0</b>		<b>2 199,9</b>		
1.1. коригування ПКД						
1.2. розроблення робочого проекту						
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАБС»		1 720,0	Договір №3019325 від 24.12.2019	2 199,9	В зв'язку з відсутністю фінансування проекту в минулих періодах фактична вартість	Розпочата робота по внесенню змін до III розділу державного інвестиційного



						договору збільшилась внаслідок інфляції та підвищення мінімальної заробітної плати	проекту
1.3. експертиза							
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС»		480,0					
1.4. затвердження проекту							
1.5. інше							
<b>2. Проведення процедури закупівлі щодо:</b>	<b>Квітень-грудень</b>	<b>61 277,0</b>			<b>157 614,9</b>		
2.1. будівельних робіт (в тому числі авторський нагляд)		61 277,0			157 614,9		
«Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод»		19 551,0					
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАЕС»		19 349,0					
		12 970,0		Договір №89 від 28.07.2017	128 314,3		
«Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»		30,0		Договір №03/2017 від 29.08.2017 (авторський нагляд)	15,4		
		8 547,0		Договір №19-05 від 14.05.2018	13 422,8		
«Технічне переоснащення СВЯП-1 в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв'язку, КВПгад»		30,0		Договір №301805 від	24,3		

			№ 301805 від 20.06.2018 (авторський нагляд)			
«Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого СВВП-1 ДСП «Чернобильська АЕС»	800,0	Договір № 18 від 22.11.2019	15 774,5			
	10,4	Договір № 301801 від 14.09.2018 (авторський нагляд)	63,6			
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
2.3. інших заходів						
<b>Разом:</b>	<b>63 477,0</b>		<b>159 814,8</b>			

\* Станом на 01.04.2021 не затверджено порядок використання коштів, план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття»».

\*\* З метою затвердження порядку використання коштів Міндовкілля листом від 01.04.2021 № 25/1-22/6612-21 направило на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію державних інвестиційних проектів у сфері природоохоронних заходів, пов'язаних із ліквідацією наслідків Чернобильської катастрофи».

План заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КПКВК 2708810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта «Укриття» будуть затверджені після затвердження порядку використання коштів

## Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
<b>1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:</b>	<b>Квітень-грудень</b>	<b>2 200,0</b>	<b>Квітень-грудень</b>	<b>0,0</b>		
1.1. коригування						
1.2. розроблення робочого проекту						
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАБС»		1 720,0		0,0		
1.3. експертиза						
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії подрібнення довгомірів на ДСП ЧАБС»		480,0		0,0		
1.4. затвердження проекту						
1.5. інше						
<b>2. Виконання, усього, у тому числі:</b>	<b>Квітень-грудень</b>	<b>61 277,0</b>	<b>Квітень-грудень</b>	<b>0,0</b>		
2.1. будівельних робіт:						
2.1.1. будівельних робіт:		61 277,0		0,0		
«Реконструкція системи збору, переробки та зберігання радіоактивно-забруднених вод»		19 551,0		0,0		
«Реконструкція блоку Б головного корпусу для створення лінії		19 349,0		0,0		




подрібнення догломів на ДСП ЧАЕС»							
«Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»		13 000,0		0,0			
«Технічне переоснащення СВЯП-1 в частині заміни силового обладнання, системи освітлення та зв'язку, КВПіГДА»		8 577,0		0,0			
«Технічне переоснащення кабельного господарства іонюючого СВЯП-1 ДСП «Чорнобильська АЕС»		800,0		0,0			
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю							
2.3. інших (враховано до вартості будівельних робіт):							
2.3.1. утримання служби замовника							
2.3.2. авторський нагляд (по трьох заходах)		70,4					
2.3.3. технічний нагляд							
<b>3. Разом: (1+2)</b>		<b>63 477,0</b>		<b>0,0</b>			

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями  
(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
63 477,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	7 207,9	6 523,9	7 523,9	7 223,9	0,0	300,0	9 000,0	24 397,4
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
63 477,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	7 207,9	6 523,9	7 523,9	7 223,9	0,0	300,0	9 000,0	24 397,4
	Касові видатки											
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ГОЛОВА ДАБЗР  
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

*Олександр Васильович Мисюра*  
(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

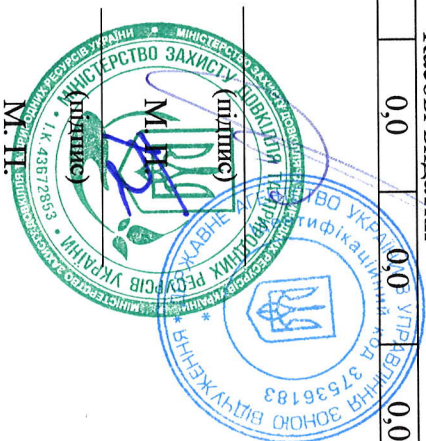

(підпис)  
М.П.

(підпис)  
М.П.

С.М. Косюк  
(ініціали та прізвище)

*В. Державський*  
(ініціали та прізвище)

## ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.04.2021р.  
(число, місяць, рік)

«Реалізація другого пускового комплексу НБК та реконструкція об'єкта «Укриття»»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство України з управління зоною відчуження
3. Найменування замовника будівництва Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС», вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська область, 07100
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) 4 704 468 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми КПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об'єкта «Укриття»»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 87 000 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації  
Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»  
Державний вищий навчальний заклад «Дніпровська державна академія будівництва та архітектури»  
Приватне акціонерне товариство «Київський НДПКі «Енергопроект»
9. Інформація щодо підрядної організації Підрядна організація не визначена
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення



### Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

### Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
<b>1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт</b>	<b>Квітень - грудень</b>	<b>10 929</b>		<b>2 490</b>		
1.1. коригування ПКД						
1.2. розроблення робочого проекту						
«Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього демонтажу»		8 903				
Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу		1 701	Договір №569 від 09.10.2020	2 490	В зв'язку з відсутністю фінансування проекту в	Розпочата робота по внесенню змін до ПП

об'єкта «Укриття», що виступають за межі огороджувального контуру НБК					минулих періодах фактична вартість догвору збільшилась внаслідок інфляції та підвищення мінімальної заробітної плати	розділу державного інвестиційного проекту
1.3. експертиза Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огороджувального контуру НБК		325				
1.4. затвердження проекту						
1.5. інше						
<b>2. Проведення процедури закупівлі щодо:</b>	<b>Квітень- грудень</b>	<b>76 071</b>				
2.1. будівельних робіт						
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
«Реконструкція об'єкта «Укриття» в частині демонтажу металеві ферми підсилення південної покрівлі		76 071				
2.3. інших заходів						
<b>Разом:</b>		<b>87 000</b>		<b>2 490</b>		

\*Станом на 01.04.2021 не затверджено порядок використання коштів, план заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КІПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об'єкта «Укриття»».

\*\*З метою затвердження порядку використання коштів Міндовкілля листом від 01.04.2021 № 25/1-22/6612-21 направило на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання коштів, передбачених у

державному бюджету на реалізацію державних інвестиційних проектів у сфері природоохоронних заходів, пов'язаних із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи».

План заходів з реалізації державного інвестиційного проекту на поточний рік та паспорт бюджетної програми КІПКВК 2708820 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реалізація другого ІК Нового безпечного конфайлмента та реконструкція об'єкта «Укриття» буде затверджено після затвердження порядку використання коштів.

### Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
<b>1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:</b>	<b>Квітень-грудень</b>	<b>10 929</b>	<b>Квітень-грудень</b>	<b>0</b>		
1.1 коригування ПКД						
1.1. розроблення робочого проекту						
«Новий безпечний конфайлмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу»		8 903		0		
Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огорожувального контуру НБК		1 701		0		
1.3. експертиза						



Реконструкція частин деаераторної етажерки та машзалу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огороджувального контуру НБК		325		0		
1.4. затвердження проекту						
1.5. інше						
<b>2. Виконання, усього, у тому числі:</b>	<b>Квітень - Грудень</b>	<b>76 071</b>	<b>Квітень- Грудень</b>	<b>0</b>		
2.1. будівельних робіт						
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
«Реконструкція об'єкта «Укриття» в частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі		76 071		0		
2.3. інших: 2.3.1. утримання служби замовника 2.3.2. авторський нагляд 2.3.3. технічний нагляд тощо						
<b>3. Разом (1 + 2)</b>		<b>87 000</b>		<b>0</b>		

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями  
(тис. гривень)


План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
87 000,0	0,0	0,0	0,0	6 223,9	316,0	1 000,0	0,0	300,0	15 047,7	22 271,6	21 095,4	20 745,4
87 000,0	0,0	0,0	0,0	6 223,9	316,0	1 000,0	0,0	300,0	15 047,7	22 271,6	21 095,4	20 745,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Касові вилатки

Гююза ДАЗВ

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

Олександр Дмитрович Мисинько  
(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

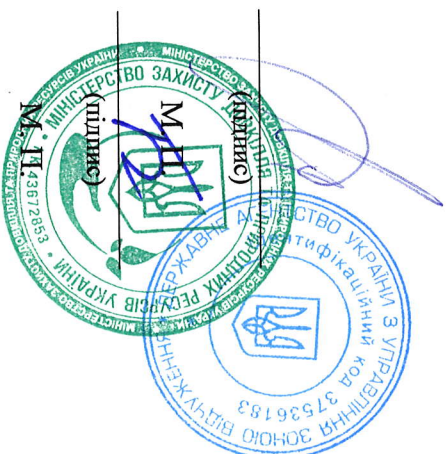

С.М.Костюк

(ініціали та прізвище)

В.В.Богданівський  
(ініціали та прізвище)
